

просст

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

п. Чернянка

"11" июня 2020 г.

№ 400-р

**О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области от 15 марта 2019 года № 122-р**

В соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области №325-р от 05 июня 2020 года «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Белгородской области от 20 августа 2018 года № 668-р», в целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной в соответствии с принципами бережливого управления на территории Чернянского района:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 15 марта 2019 года №122-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению картирования процессов в органах местного самоуправления Чернянского района» следующие изменения:

1.1 Пункт 2 распоряжения изменить и изложить в следующей редакции: «Рекомендовать муниципальным учреждениям муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, главам администраций городского и сельских поселений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в целях осуществления своей деятельности в соответствии с принципами бережливого управления, руководствоваться настоящим распоряжением.».

1.2 Методические рекомендации по проведению картирования процессов в органах местного самоуправления Чернянского района, утвержденные частью 1 распоряжения, изменить и изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения, возложить на руководителя аппарата администрации Чернянского района (Овсянникова Л.Н.).

Глава администрации
Чернянского района



Т.П. Круглякова

**Приложение
к распоряжению администрации
муниципального района
«Чернянский район»
Белгородской области
от 21 декабря 2020г.
№ ЧЕО-р**

**Методические рекомендации по проведению картирования
процессов в органах местного самоуправления Чернянского района**

1. Основные положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по проведению картирования процессов в органах местного самоуправления Чернянского района (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 15.11.2018 г. №549 «Об утверждении Положения о бережливом управлении в органах местного самоуправления Чернянского района».

1.2. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной в соответствии с принципами бережливого управления в органах местного самоуправления Чернянского района, структурных подразделениях администрации Чернянского района, имеющих статус юридического лица.

1.3. Настоящие методические рекомендации определяют порядок проведения картирования процессов органами местного самоуправления Чернянского района.

1.4. Картирование процесса - схема (алгоритм), отображающая каждый этап движения материальных и информационных потоков с целью выявления возможностей усовершенствования текущего процесса и его приближения к оптимальному состоянию.

Картирование процесса является одним из инструментов бережливого управления.

Результатом картирования процессов является:

- инициация и реализация бережливых проектов, которые также могут объединяться в портфели проектов органа местного самоуправления Чернянского района;

- утверждение и реализация дорожных карт по улучшениям процессов.

1.5. Задачи картирования:

- выработка единого понятийного аппарата для всех участников процесса;

- визуализация каждого этапа движения материальных информационных потоков;
- выявление потерь и их источников;
- разработка и реализация эффективных управленческих решений для оптимизации процесса.

1.6. Картрирование процесса включает в себя 5 этапов:

- подготовительный этап;
- построение карты текущего состояния процесса;
- поиск и анализ проблем;
- построение карты идеального состояния процесса;
- построение карты целевого состояния процесса;
- разработка плана мероприятий.

1.7. Разработанные по итогам картрирования бережливые проекты или дорожные карты по улучшениям должны быть визуализированы на стенде бережливого проекта.

1.8. В течение 30 календарных дней с даты защиты итогов реализации проекта на экспертной комиссии по вопросам проектной деятельности формируется архив бережливого проекта, включающий:

- копию протокола экспертной комиссии по вопросам проектной деятельности, на которой был защищен бережливый проект;
- утвержденный паспорт и план управления проектом;
- результаты анкетирования потребителей;
- кейс по итогам реализации бережливого проекта;
- стандартную операционную процедуру проекта;
- производственный анализ апробации стандартной операционной процедуры процесса;
- копии разработанных в рамках проекта правовых актов, шаблонов, форм, перечней и иных документов, направленных на оптимизацию процесса.

Архив бережливого проекта формируется руководителем бережливого проекта в электронном виде и хранится не менее двух лет.

2. Рекомендации по организации и методике проведения подготовительного этапа картрирования процессов

2.1. Подготовительный этап картрирования процессов представляет собой сбор и обобщение информации о процессах в органах местного самоуправления, выбор проблемных процессов, определение внутреннего и внешнего потребителя.

2.2. Задача подготовительного этапа картрирования – получить информацию обо всех процессах в органах местного самоуправления с целью выявления и устранения потерь.

2.3. Подготовительный этап картрирования включает в себя:

- выбор процесса;
- обоснование выбора процесса;

- определение границ процесса;
- формирование команды картирования;
- определение целей и эффектов;
- анкетирование потребителей.

2.4. Процесс для оптимизации отбирается на основании следующих критериев:

- не удовлетворяет внутренних и (или) внешних потребителей;
- является наиболее ресурсоемким;
- затрудняет повышение эффективности органа местного самоуправления или данного структурного подразделения;
- приводит к срыву сроков выполнения работ в рамках деятельности органа местного самоуправления или структурного подразделения.

2.5. В обосновании выбора процесса необходимо указать причины возникновения потребности в улучшении процесса:

- периодичность повторения процесса;
- количество участников процесса, количество внутренних и внешних потребителей;
- количество обрабатываемых в процессе документов;
- наличие факта/риска нарушения сроков;
- наличие ошибок, возможности неоднократного возврата на доработку разрабатываемых в рамках процесса документов;
- необходимость повторного и (или) дополнительного запроса информации;
- низкий уровень удовлетворенности потребителей;
- иные потери, встречающиеся в процессе.

2.6. Определение границ процесса - мероприятие, которое позволяет определить масштабы оптимизации процесса с целью оптимального распределения имеющихся ресурсов.

Основные этапы определения границ процесса:

- определение первой и последней операции в процессе;
- определение потребителя процесса, получающего и использующего результаты процесса;
- определение конечного результата процесса.

Границы процесса тяжественны первой и последней операции в процессе.

2.7. После выбора процесса и определения его границ формируется команда картирования.

2.7.1. Команда картирования представляет собой группу лиц, объединенных для выполнения конкретной задачи по усовершенствованию процесса.

2.7.2. В состав команды картирования входят:

- владелец процесса (сотрудник отдела, выполняющий основные работы по процессу);

- сотрудники отдела, задействованные в реализации процесса (2 – 4 человека);
- эксперты (сотрудники не участвующие в процессе, 1 – 2 человека);
- основные исполнители, не являющиеся сотрудниками отдела;
- потребители.

2.8. Определение целей и эффектов оптимизации процесса.

2.8.1. Целью оптимизации процесса является устранение выявленных в ходе картирования потерь.

2.8.2. Формулировка цели оптимизации процесса должна быть:

- конкретной;
- измеримой;
- достижимой в рамках обозначенного периода времени.

2.8.3. Цель оптимизации процесса должна решать следующие проблемы:

- сокращать время протекания процесса;
- способствовать росту качественных характеристик процесса.

2.8.4. Числовые данные целей оптимизации процесса подлежат корректировке после проведения построения карт текущего, идеального и целевого состояний процесса.

2.8.5. Эффектами оптимизации процесса являются:

- экономический эффект;
- эффект для населения;
- повышение удовлетворенности потребителей процесса.

2.9. Анкетирование проводится на подготовительном этапе картирования и по итогам оптимизации процесса.

Целями анкетирования являются определение удовлетворенности потребителей состоянием процесса, выявление проблемных зон в процессе.

Анкетирование проводится в виде очного или заочного анкетного опроса.

Допускается использование как почтового, так и раздаточного анкетирования. Возможно проведение анкетирования с использованием различных интернет - сервисов.

Анкета разрабатывается с учетом специфики определенного для картирования процесса.

2.10. По результатам выполнения мероприятий, изложенных в пунктах 2.4 – 2.9 настоящего раздела, заполняется карточка процесса по форме согласно приложению № 1 к методическим рекомендациям.

3. Рекомендации по методике построения карты текущего состояния процесса

3.1. Карта текущего состояния процесса - это графическое представление последовательности операций, позволяющее увидеть проблемы в процессе, их первопричины, а также разработать предложения по улучшению процесса.

3.2. Основные этапы составления карты текущего состояния процесса:

- проведение предварительного анализа текущего состояния процесса;
- проведение замеров времени по процессу;
- изображение карты текущего состояния процесса на бумажном носителе формате А1 в виде блок-схемы.

3.2.1. Проведение предварительного анализа текущего состояния процесса по следующим факторам:

- определение количества задействованного персонала;
- определение количества задействованного оборудования;
- определение перемещений сотрудников;
- определение последовательности выполнения операций.

3.2.2. Форма заполнения замеров времени (хронометража) по процессу представлена в приложении № 2 к методическим рекомендациям.

Хронометраж процесса включает:

- хронометраж операций в рамках процесса;
- хронометраж перемещений;
- хронометраж времени простоя.

При проведении замеров времени (хронометража) по процессу необходимо:

- ознакомиться с правовой документацией, регламентирующей процесс;
- определить сроки реализации процесса;
- определить последовательность операций по участникам процесса (операции процесса записываются в хронологическом порядке).

Формулировка операции должна включать в себя ответы на вопросы:

«Кто делает?»;

«Что делает?»;

«Сколько времени на это затрачивается?».

В зависимости от степени детализации процесса операции могут быть объединены в блоки операций.

При проведении замеров времени (хронометража) по процессу определяется время, затрачиваемое на каждую операцию, которое заносится в таблицу (приложение № 2).

При проведении хронометража необходимо зафиксировать время ожидания (простоя) между операциями процесса.

Количество замеров времени (хронометража) по процессу должно быть не менее 5(пяти) для процессов, длительность которых не превышает 7 (семь) дней.

При невозможности фактического проведения необходимого количества замеров время определяется на основании, как минимум, одного замера и экспертной оценки имеющихся материалов (входящие/исходящие письма, журналы регистрации, электронные системы и т.п.).

3.2.3. Изображение карты текущего состояния процесса на бумажном носителе формата А1 в виде блок-схемы осуществляется после проведения всех замеров и отражает операции в рамках процесса, временные интервалы их выполнения от минимального до максимального значения времени. Форма карты текущего состояния процесса представлена в приложении № 3 к настоящим методическим рекомендациям.

3.2.3.1. При построении карты текущего состояния операции в процессе отражаются слева направо последовательно.

В случае, когда при проведении замеров по процессу устанавливается вариабельность выполнения операций, варианты протекания отображаются на карте с помощью пунктирных линий разных цветов по форме согласно приложению №4 к методическим рекомендациям.

Основные операции процесса наносятся на карту при помощи стикеров и условных обозначений (приложение № 5) с указанием временных интервалов их выполнения.

Время всех операций и время ожиданий необходимо указывать в единых единицах измерения в диапазоне от минимального до максимального значения.

Операции процесса на карте отражаются последовательно.

Информацию об операциях процесса (наименование, данные об исполнителе, временные интервалы выполнения) рекомендуется наносить на желтые стикеры.

В отношении каждой операции процесса задаются вопросы, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Вопросы, задаваемые к операциям процесса

№ п/п	Вопросы	Ответы на вопросы
1.	Кто делает?	Определяем поставщика работы (ценности)
2.	Что делает?	Определяем операцию
3.	Откуда и куда?	Определяем маршрут: что предшествует данной операции и следует после нее
4.	Когда и сколько тратится времени	Определяем время каждой операции, время простоя между операциями

	(периодичность)?	
5.	Есть ли проблемы при выполнении операции?	Определяем проблемы, возникающие в ходе выполнения операции

3.2.3.2. С помощью условных обозначений в процессе отображения операции на карту наносятся проблемы, выявленные в ходе выполнения операций.

Для обозначения на карте проблем рекомендуется использовать красные стикеры.

Проблемы необходимо наносить на карту последовательно по мере их выявления в процессе.

В случае, когда между операциями имеются потери в виде ожидания, данная информация наносится на карту между операциями с указанием времени ожидания.

2.3. После того, как на карту текущего состояния процесса нанесена информация по каждой операции, подсчитывается общее время протекания процесса.

Время протекания процесса (ВПП) - сумма общего времени по всем операциям, включая общее время ожиданий, в диапазоне от минимального до максимального значения.

Время протекания процесса рассчитывается по варианту протекания, включающему максимальное количество операций, и учитывает возвраты и повторное выполнение операций.

2.4. В верхней части карты указывается ее вид: «Карта текущего состояния процесса» и наименование процесса.

2.5. В верхнем правом углу карты указывается дата ее составления.

4. Рекомендации по методике поиска и анализа проблем

4.1. Анализ проблем, выявленных в ходе построения карты текущего состояния, включает:

4.1.1. Построение пирамиды проблем по форме согласно приложению № 6 к методическим рекомендациям, предусматривающее ранжирование проблем по уровням:

- уровень органа местного самоуправления (отдела, управления, структурного подразделения имеющие статус юридического лица)- проблемы, решение которых не требует привлечения дополнительных ресурсов и возможно силами органа местного самоуправления, в котором проходит картирование;

- региональный уровень – проблемы, решение которых требует проведения мероприятий с привлечением органов власти области и внесением изменений в региональное законодательство;

- федеральный уровень - проблемы, решение которых требует внесение изменений в федеральное законодательство, работу федеральных программ.

4.1.2. Поиск первопричин проблем, выявленных в ходе построения карты текущего состояния процесса, и определение путей их решения.

Для поиска первопричин проблем рекомендуется использовать один из методов:

- «5 почему?» – заключается в изучении причинно-следственных связей, лежащих в основе той или иной проблемы. Основной задачей техники является поиск первопричины возникновения проблемы с помощью повторения вопроса – «Почему?». Каждый последующий вопрос задаётся к ответам на предыдущий вопрос;

- «Метод Киплинга» – заключается в последовательной постановке вопросов: «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», «Как?», «Почему?» и подробных ответов на них в рамках поставленной задачи;

- «Диаграмма Исиавы» – представляет собой график, на основании которого исследуются и определяются ключевые причинно-следственные связи факторов и последствий рассматриваемой проблемы.

4.1.3. После поиска первопричин проблем командой картирования на основе имеющейся информации методом «мозгового штурма» разрабатываются возможные решения. Для каждой первопричины необходимо разработать не менее 2 (двух) решений.

4.1.4. После разработки решений необходимо провести оценку вклада каждого варианта решения в достижение цели мероприятий по повышению эффективности процесса (сокращение времени, расстояний, количества участников и т.д.).

4.1.5. По итогам анализа проблем на бумажном носителе формата А4 или А3 заполняется таблица «Анализ проблем» по шаблону согласно приложению № 7 к методическим рекомендациям.

5. Рекомендации по методике составления карты идеального состояния процесса

5.1. Карта идеального состояния процесса – это графическое представление последовательности операций, позволяющее смоделировать идеальное состояние процесса, к которому необходимо стремиться.

Форма карты идеального состояния процесса представлена в приложении № 8 к методическим рекомендациям.

5.2. Процесс в идеальном состоянии характеризуется минимально возможным временем протекания и количеством задействованных ресурсов, отсутствием брака.

5.3. Построение карты идеального состояния процесса включает в себя следующие этапы:

- определение границ процесса, начала и окончания процесса;
- выработка решений о соединении всех операций процесса между собой с исключением всех потерь;
- указание времени каждой операции;

- подсчет времени протекания процесса.

6. Рекомендации по методике составления карты целевого состояния процесса

6.1 Карта целевого состояния процесса - это графическое представление последовательности операций, позволяющее увидеть, каким будет процесс после внедрения разработанных улучшений, которые могут быть применены в сроки реализации проекта по повышению эффективности процесса при наличии необходимых ресурсов. Форма карты целевого состояния процесса представлена в приложении № 9 к методическим рекомендациям.

6.2 Построение карты целевого состояния процесса включает в себя следующие этапы:

- определение границ процесса, начала и окончания процесса;
- выработка решений о соединении всех операций процесса между собой с отражением потерь, которые в данный момент невозможно исключить;
- указание времени каждой операции;
- подсчет времени протекания процесса;
- расчет экономии времени (в процентах) протекания процесса.

7. Рекомендации по разработке плана мероприятий

7.1. План мероприятий по достижению целей основывается на предложенных сотрудниками вариантах решений проблем, выявленных в процессе картирования.

7.2. При составлении плана мероприятий необходимо детализировать решения, предложенные в рамках анализа проблем.

Решения, необходимость которых не обоснована в рамках анализа проблем, в план мероприятий не включаются.

7.3. В плане необходимо обозначить все мероприятия, которые будут реализованы для решения проблем в рамках достижения целевого состояния процесса. План мероприятий представлен в таблице 2.

Одно мероприятие может быть направлено на решение нескольких проблем. На решение одной проблемы могут быть направлены несколько мероприятий.

7.4. Важно определить ответственных за каждое мероприятие и срок реализации мероприятия, указав его дату начала и окончания.

Таблица 2**План мероприятий**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок начала	Срок окончания

8. Рекомендации по реализации плана мероприятий

8.1. После разработки плана мероприятий итоги картирования оцениваются на соответствие критериям (таблица 3).

Таблица 3
**Критерии разграничения
«Бережливых проектов» и «Дорожных карт по улучшениям»**

№ п/п	Критерий	Бережливый проект	Дорожная карта по улучшениям
1.	Длительность	3 месяца – 1 год	до 3-х месяцев
2.	Количество и уровень выявленных проблем	8 и более разноуровневых проблем, для каждой из которых предлагается отдельное решение	менее 8 проблем
3.	Результат	создана новая модель или механизм, оптимизация процесса не менее чем на 30%	мелкие улучшения
4.	Эффект для населения	выражен или выражен опосредованно	не обязателен
5.	Экономический эффект	просчитывается экономия денежных средств, трудовых ресурсов	отсутствует
6.	Участие	не менее 2-х подразделений	в рамках одного структурного подразделения
7.	Тиражирование	возможно	не требуется

8.2. Бережливым проектом признаются результаты картирования при соответствии заявленным критериям в полном объеме.

9. Рекомендации по оформлению стенда бережливого проекта

9.1. На стенде бережливого проекта визуализируются следующие инструменты бережливого управления:

- карточка процесса, подписанная руководителем проекта и заказчиком;
 - карта текущего состояния;
 - пирамида проблем;
 - результаты анализа проблем с приложением использованного для анализа метода;
 - карта идеального состояния;
 - карта целевого состояния;
 - диаграмма Ганта;
 - уголок решенных проблем;
 - производственный анализ.

9.2. Элементы стенда бережливого проекта: карточка процесса, карта текущего состояния, пирамида проблем, анализ проблем, карта идеального состояния, карта целевого состояния оформляются в соответствии с требованиями разделов 2 – 6 настоящих методических рекомендаций.

9.3. Диаграмма Ганта – это инструмент планирования, управления работами в рамках бережливого проекта/дорожной карты по улучшениям.

9.3.1. Диаграмма Ганта представляет собой горизонтальные полосы, расположенные между двумя осями: перечень работ по вертикали и даты по горизонтали с ежедневной детализацией.

9.3.2. Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную работу в составе бережливого проекта/дорожной карты по улучшениям и показывает даты ее начала, завершения и длительность.

Начало каждой полосы соответствуют дате начала работы над задачей, а ее конец – дата завершения (таблица 4).

Таблица 4

Диаграмма Ганта

9.3.3. Рабочие совещания, в рамках которых закрашиваются полосы по мере выполнения работ, проводятся ежедневно:

- если в течение дня, на который было запланировано выполнение определенного объема, выполнялись поставленные в рамках выполняемой работы задачи, то день закрашивается зеленым цветом;

- если в течение дня, на который было запланировано выполнение определенного объема, не выполнялись поставленные в рамках выполняемой работы задачи, то день закрашивается красным цветом.

9.3.4. На диаграмме Ганта необходимо разместить визуальный индикатор, отображающий текущую дату.

9.4. Уголок решенных проблем – это инструмент контроля эффективности реализованных мероприятий по оптимизации процесса.

9.4.1. Уголок решенных проблем состоит из четырех разделов: «Проблема», «Решение», «Визуализация решения», «Вклад в цель» (таблица 5).

Таблица 5
Уголок решенных проблем

Проблема	Решение	Визуализация решения	Вклад в цель

9.4.2. По мере реализации бережливого проекта/дорожной карты по улучшениям проблемы из пирамиды проблем необходимо перемещать в уголок решенных проблем в столбец «Проблема» с указанием мероприятий, которые были реализованы для их устранения, в столбце «Решение» и визуализацией подтверждающих материалов в столбце «Визуализация решения».

9.4.3. По итогам реализации мероприятия по улучшению проводятся контрольные замеры времени для участка процесса, на котором внедрялись улучшения (таблица 6).

Таблица 6**Форма контрольных замеров времени для участка процесса «....»**

Дата проведения	Наименование операции	Время протекания процесса		Расхождение (+/-)	Причина расхождения
		План	Факт		

9.4.4. Фактически достигнутая экономия времени указывается в столбце «Вклад в цель» уголка решенных проблем (таблица 5).

9.4.5. Фактически достигнутая экономия времени должна быть больше либо равна времени, которое было обозначено в качестве вклада в цель на этапе анализа данной проблемы.

В том случае, если фактически достигнутая экономия времени меньше времени, которое было обозначено в качестве вклада в цель на этапе анализа данной проблемы, необходимо принять корректирующие действия по достижению целевых показателей экономии времени.

9.5. Производственный анализ – это инструмент оценки эффективности реализации бережливого проекта/дорожной карты по улучшениям в целом.

9.5.1. Производственный анализ проводится по итогам внедрения всех мероприятий по улучшениям и представляет собой итоговые замеры общего времени протекания процесса.

9.5.2. Результаты замеров времени по процессу заносятся в бланк производственного анализа (таблица 7).

Таблица 7**Производственный анализ процесса «....»**

Дата проведения	Время протекания процесса		Расхождение (+/-)	Причина расхождения
	План	Факт		

9.5.3. В колонке «План» указывается время протекания процесса, которое планировалось достичь по итогам реализации бережливого проекта/дорожной карты по улучшениям (время протекания процесса на карте целевого состояния).

В колонке «Факт» указывается фактическое время протекания процесса по итогам замера времени.

В колонке «Расхождение» указывается разница между плановой и фактически достигнутой длительностью процесса.

В колонке «Причина расхождения» указывается причина отклонения от плановых значений:

- если фактическая длительность процесса превышает запланированную, необходимо указать причины отклонения и корректирующие действия, которые будут направлены на обеспечение достижения плановых значений;

- если фактическая длительность процесса меньше запланированной, необходимо указать, что позволило обеспечить перевыполнение плановых значений.

9.5.4. В рамках производственного анализа необходимо провести не менее 5 замеров времени по процессу.

Исключение – процессы, периодичность протекания которых составляет более шести месяцев. Для таких процессов достаточно одного замера времени в рамках реализации бережливого проекта, последующие осуществляются в рамках постпроектной деятельности.

9.6. Стенд бережливого проекта формируется последовательно по мере применения соответствующих инструментов бережливого управления и сохраняется до момента картирования следующего процесса.

9.7. В течение одного календарного года после завершения бережливого проекта на стенде бережливого проекта сохраняются следующие элементы:

- разработанная и утвержденная в рамках реализации стандартная операционная процедура;

- производственный анализ, который заполняется кратно периодичности протекания процесса в течение календарного года в качестве аprobации и проверки актуальности стандартной операционной процедуры в проектной деятельности.

Приложение №1
к методическим рекомендациям
по проведению картирования
процессов в органах местного самоуправления
Чернянского района

Подготовлено

Руководитель проекта _____ Ф.И.О.
 (подпись)

Утверждаю

Заказчик _____ Ф.И.О.
 (подпись)

Карточка процесса «...»

Общие данные:

Заказчик: (руководитель структурного подразделения/руководитель организации, курирующий орган местного самоуправления).

Процесс: (наименование проблемного процесса).

Границы процесса: (от «первая операция в процессе» до «последняя операция в процессе»).

Руководитель проекта: (сотрудник, который несет ответственность за процесс во всех его аспектах).

Команда картирования:

Обоснование:

Необходимо указать причины возникновения потребности в улучшении процесса в числовых показателях:

- периодичность повторения процесса;
- количество участников процесса;
- количество обрабатываемых в процессе документов;
- наличие нарушения сроков;
- наличие ошибок, возвратов на доработку документов;
- необходимость повторного, дополнительного запроса информации;
- иные причины, характеризующие процесс;
- удовлетворенность потребителей до начала реализации проекта

Цели:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса, мин.		
2. Изменение качественных характеристик процесса:		
2.1. Сокращение доли некорректно подготовленных документов, %		
2.2. Сокращение количества возвратов на доработку, раз.		
2.3.-2.п Иные качественные характеристики процесса		

Эффекты:

1. Эффект для населения.
2. Экономический эффект.
3. Удовлетворенность потребителей по итогам реализации проекта

Сроки:

1. Разработка карточки процесса (дата).
2. Картирование процесса:
 - 2.1. Разработка текущей карты процесса (дата начала – дата окончания).
 - 2.2. Поиск и выявление проблем (дата начала – дата окончания).
 - 2.3. Разработка идеальной карты процесса (дата начала – дата окончания).
 - 2.4. Разработка целевой карты процесса (дата начала – дата окончания).
 - 2.5. Разработка плана мероприятий (дата начала – дата окончания).
 - 2.6. Защита проекта на экспертной комиссии/«дорожной карты» перед заказчиком (дата).
3. Внедрение улучшений (дата начала – дата окончания).
4. Производственный анализ.
5. Закрытие проекта

Приложение №2
к методическим рекомендациям
по проведению картирования
процессов в органах местного самоуправления
Чернянского района

Форма заполнения замеров времени (хронометража) по процессу

Наименование процесса: _____							Дата проведения хронометража « » ____ г.	
Регламентированное время выполнения процесса _____								
Участник процесса 1		Ф.И.О. Должность						
Участник процесса 2		Ф.И.О. Должность						
№ п/п	Наименование работ (операций) по процессу		Фактическое время начала операции	Фактическое время окончания операции	Время выполнения операции	Время ожидания (простоя) при свершении операций/ между операциями	Причины простоя при совершении операций/между операциями	Отклонение от регламентированных сроков (если имеются)
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Наименование операции 1							
2.	Наименование операции 2							
3.	Наименование операции 3							
4.	Наименование операции 4							
n	Наименование операции n							
Общее фактически затраченное время на процесс*								


*заполняется графа 5

Приложение №3
к методическим рекомендациям
по проведению картирования процессов
в органах местного самоуправления
Чернянского района


Пример

10 марта 2020 года

Карта текущего состояния процесса «...»



Карта текущего состояния процесса «Первичный прием граждан»

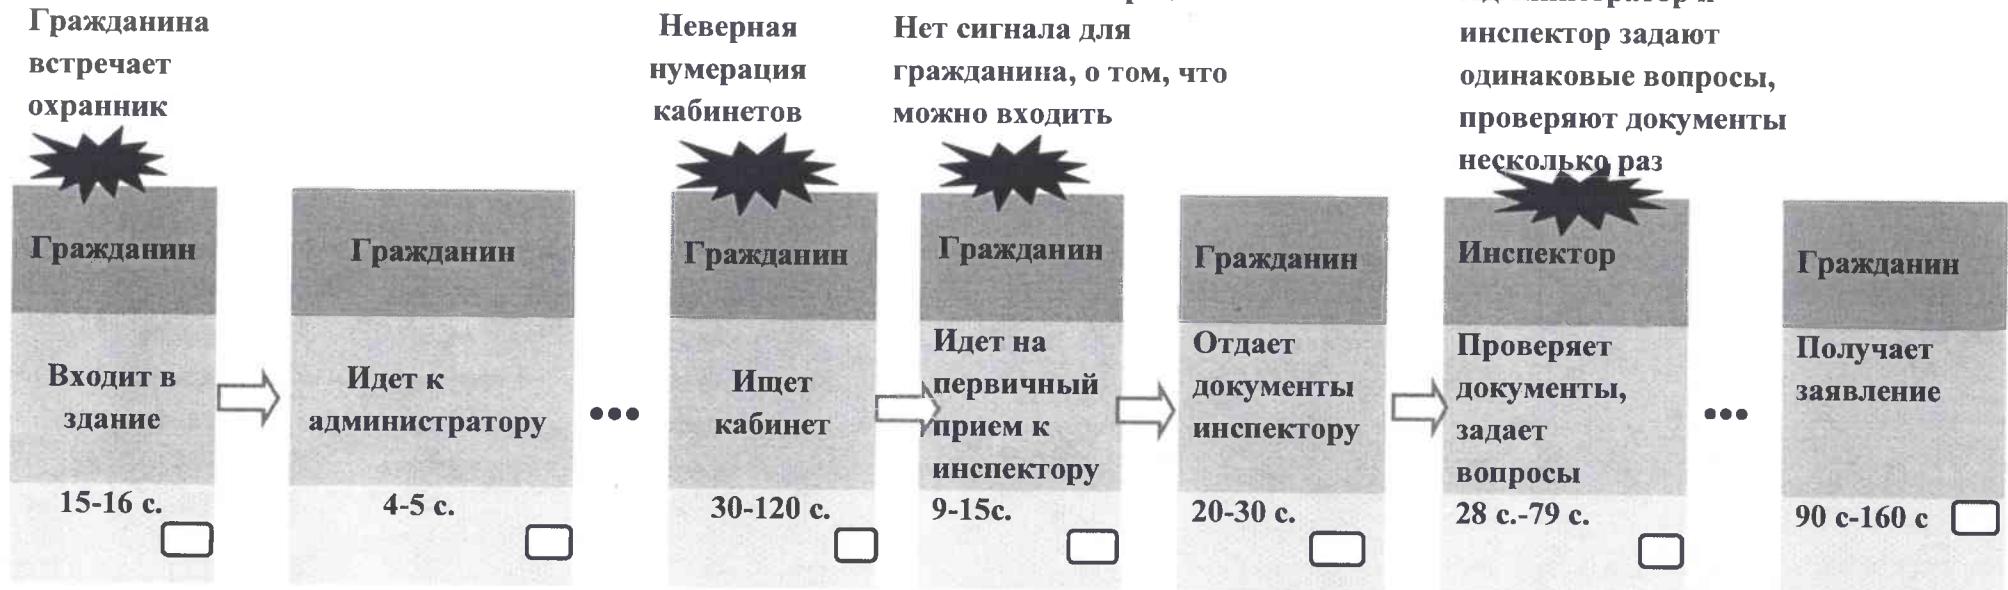


ВПП (время протекания процесса)-3306с. – 8180с.

Приложение №4
к методическим рекомендациям
по проведению картирования процессов
в органах местного самоуправления,
Чернянского района

Пример

Карта вариабельного процесса
Участок процесса «Первичный прием граждан»

10 марта 2020 года

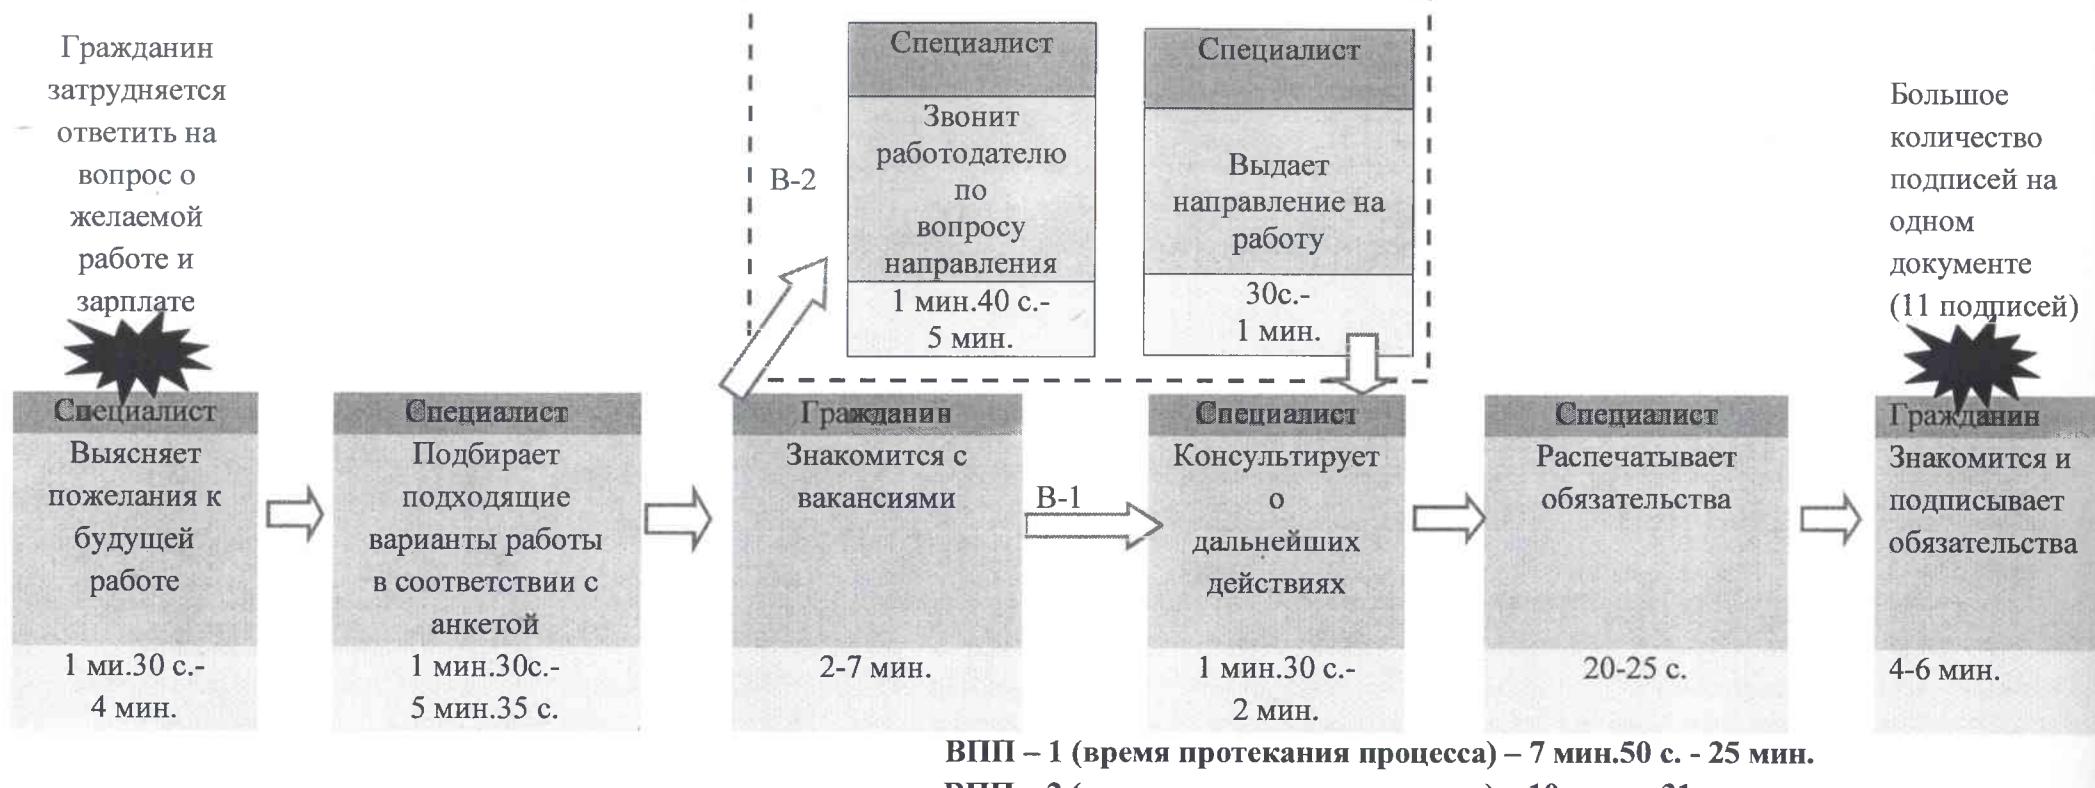

Приложение №5
к методическим рекомендациям
по проведению картирования процессов
в органах местного самоуправления
Чернянского района


Условные обозначения, рекомендуемые для построения карты процесса

Термин	Обозначение	Описание
1.Операция процесса		Используется для обозначения операций участника процесса. Операция записывается в текстовое окно следующим образом: «делает... (что-то)»; то есть «глагол + существительное»
2.Направление потока операций		Используется для обозначения передачи документа/информации. Показывает направление потока, взаимосвязь отдельных элементов процесса
3.Связь операции с созданием/изменением/использованием документа (вход/выход)		Используется для обозначения связи операции с созданием/изменением документа. Стрелка, направленная в «редакцию документа» (п.4), означает «выход»; стрелка, направленная в «операцию участника процесса» (п.1)- «вход»
4.Редакция документа		Используется для обозначения стадий прохождения документации. Номер 1 обозначает созданный/заполненный впервые документ, дальнейшая нумерация – этапы визирования, этапы дополнения/изменения документа и т.п. Повторное согласование документов в схеме не отражается
5. Обмен информацией		Используется для обозначения процесса оперативного сбора данных. Рекомендуется использовать данное обозначение, чтобы показать все дополнительные операции
6. Передача из рук в руки		Используется для обозначения передачи документа на бумажном носителе из рук в руки
7. Передача по электронной почте		Используется для обозначения передачи документа/информации по электронной почте
8.Передача по телефону		Используется для обозначения передачи информации по телефону
9.Передача через электронную систему		Используется для обозначения передачи информации в специальной электронной системе/программе
10. Дополнительная информация		Используется для обозначения любой текстовой дополнительной информации, имеющей существенное значение для анализа и проведения дальнейших улучшений
11. Потери/несоответствия, проблемы		Используется для обозначения выявленных проблем/нарушений/потерь в потоках и процессах. Цвет-красный. Цифрой обозначается порядковый номер
12. Решение проблем		Используется для обозначения решений проблем. Цвет - зеленый/голубой. Цифрой обозначается порядковый номер

Приложение №6
к методическим рекомендациям
по проведению картирования процессов
в органах местного самоуправления
Чернянского района

Форма

Пирамида проблем

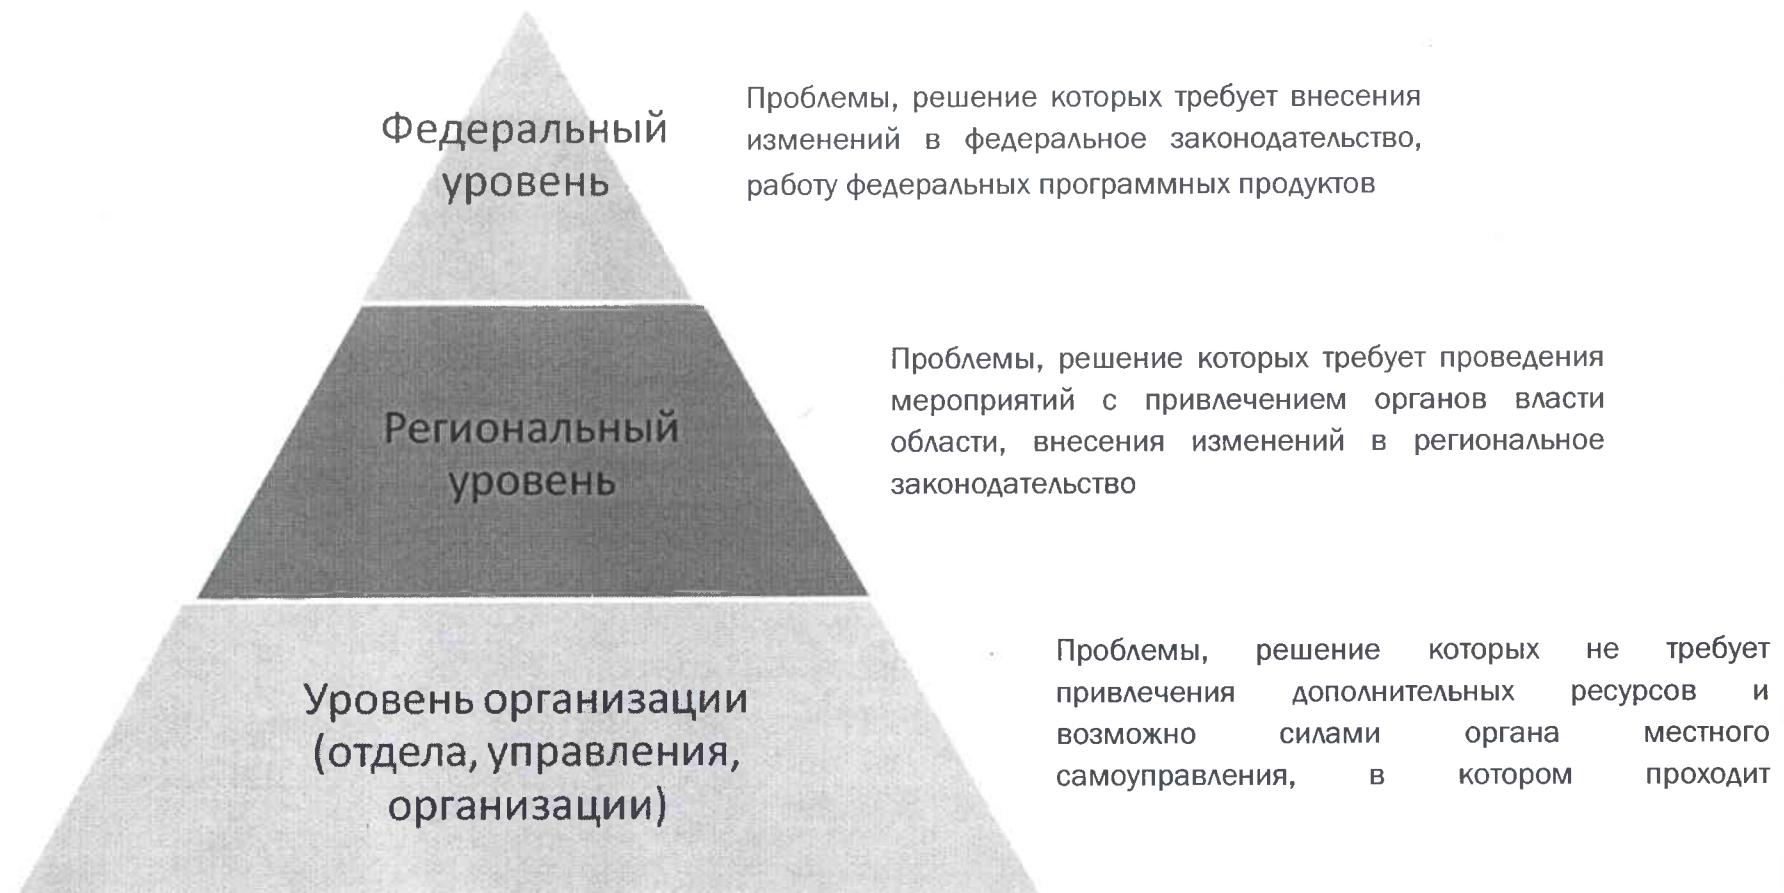

Приложение №7
к методическим рекомендациям
по проведению картирования процессов
в органах местного самоуправления
Чернянского района

Шаблон таблицы «Анализ проблем»

Проблемы	Первопричины	Решения	Вклад в достижение цели

•

Приложение №8
к методическим рекомендациям
по проведению картирования процессов
в органах местного самоуправления
Чернянского района


Пример

Карта идеального состояния процесса «...»

20 марта 2020 года

Исполнитель
Описание шага процесса
Продолжительность

Карта идеального состояния процесса «Первичный прием граждан»

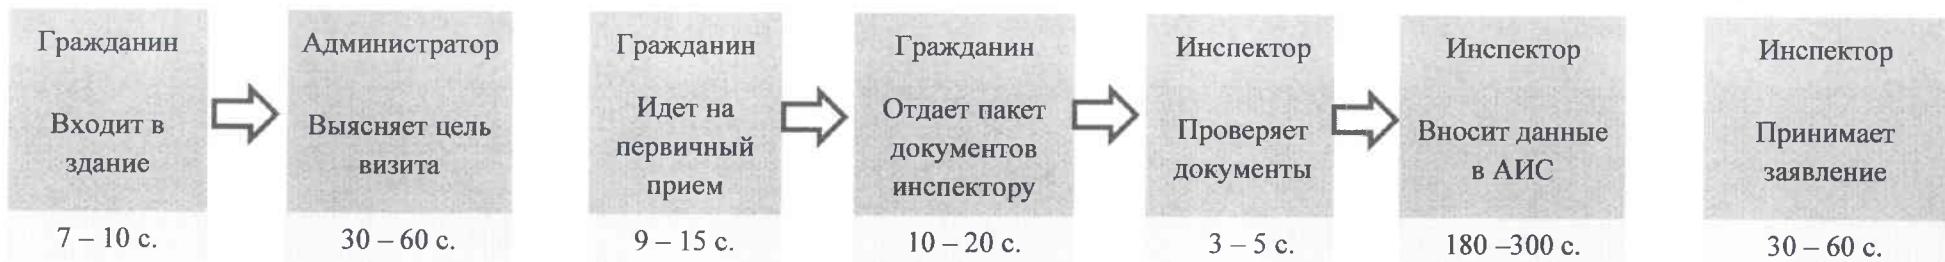

ВПП (время протекания процесса) – 630 с. – 1157 с.

Приложение № 9
к методическим рекомендациям
по проведению картирования процессов
в органах местного самоуправления
Чернянского района

Пример

Карта целевого состояния процесса «...»

20 марта 2020 года

